

بلوک D1

گزارش عملکرد ماهانه
مهر ماه ۱۴۰۴

امیران
آبتبار
اسیادانا



مجتمع مسکونی
بزرگ چیتگر



هلی پد و موتورخانه پشت بام



شرح اجرا ○ ادامه اجرای فول پیچ و تکمیل کاری



۱۴۰۴.۰۷.۳۰

واحد‌های مسکونی






۱۴۰۴.۰۶.۳۱



شرح اجرا

- اجرای نصب ورق های آلومینیوم 3d و نصب فلاشینگ دور پنجره ها در بال غربی و بال شرقی
- اجرای نصب رانر و استاد و پنل های لایه اول دیوارهای داخلی طبقه ۲۷+ و ۲۶+ بال شرقی و بال غربی
- تکمیل نصب فریم درب و ورودی واحدها ی طبقه ۲۵+ بال غربی و بال شرقی
- اجرا و اتمام پلاستر و شیب بندی سرویس ها و آشپزخانه های طبقه ۲۳+ بال شرقی و بال غربی
- اتمام گچ کاری زیر کار طبقه ۲۱+ بال غربی
- اجرا و اتمام کفسازی واحدهای مسکونی طبقه ۲۳+ بال غربی
- اجرا و اتمام سرامیک کاری کف واحدها ، بدنه و کف سرویس ها و آشپزخانه ها طبقه ۱۸+ بال شرقی و بال غربی
- اتمام اجرای سرامیک کاری کف واحدها ، بدنه و کف سرویس ها و آشپزخانه ها و تراس های طبقه ۱۷+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای عایق بندی و قیرگونی سرویس ها ، آشپزخانه ها و تراس های طبقه ۱۹+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای نصب عایق و پنل های لایه دوم دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه ۱۵+ بال شرقی و بال غربی
- اجرا و اتمام گچ کاری روکار طبقه ۱۲+ بال غربی
- اجرای زیر سازی سقف کاذب طبقه ۱۱+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای نصب پنل های سقف کاذب طبقه ۷+ بال شرقی

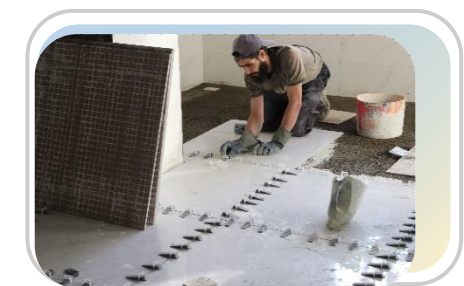

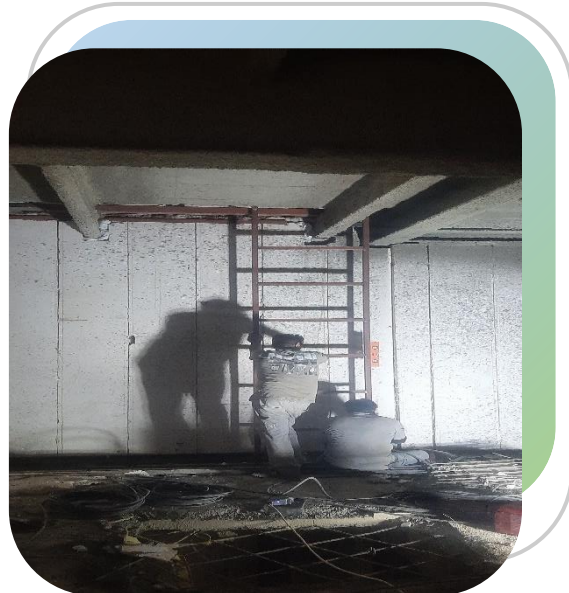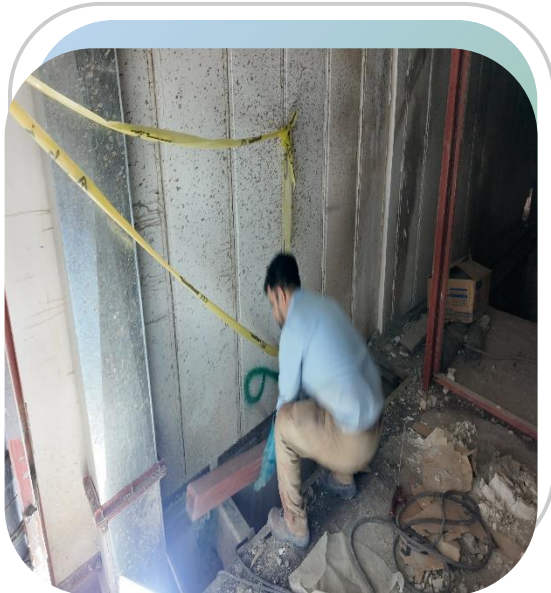

راهرو ها و مشاعات

شرح اجرا ○ اجرای نصب وال پست دیوار مشاعات در بال غربی و بال شرقی



لابی و واحدهای تجاری



ادامه اجرای زیر سازی و پاشش ضد حریق در قسمت میانی طبقه همکف

شرح اجرا 




تاسیسات




- اجرای لوله کشی برق (لوله سقفی) در طبقه ۱۷+ بال غربی
- اجرای تکمیل کاری لوله های سقفی برق طبقه ۱۳+ و ۱۴+ بال غربی
- اجرای لوله کشی برق (لوله سقفی) در طبقات ۱۹+ بال شرقی
- اجرای سیم کشی واحدهای مسکونی طبقه ۹+ بال شرقی
- اجرا و اتمام لوله های فاضلاب طبقه ۲۳+ و ۲۴+ بال غربی
- اجرای نصب ساپورت های تاسیساتی و لوله کشی ۵ لایه طبقه ۲۲+ و ۲۳+ بال غربی
- اجرای لوله کشی آتش نشانی در طبقات ۲۰+ بال شرقی و ۱۵+ و بال غربی
- اجرای مونتاژ و نصب لوله های اصلی رایزرها
- اجرای نصب کانال های تهویه واحدها طبقه ۱۸+ و ۱۹+ بال شرقی و بال غربی
- ادامه ساخت و نصب کانالهای تهویه در طبقات

شرح اجرا

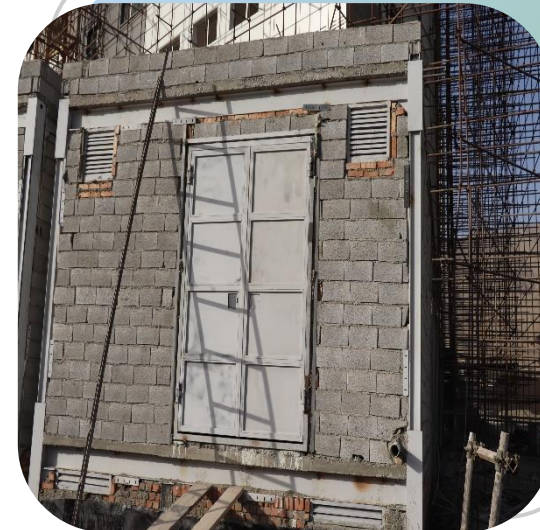

پست برق

شرح اجرا ○ اجرای نصب درب ها و دریچه های پست برق

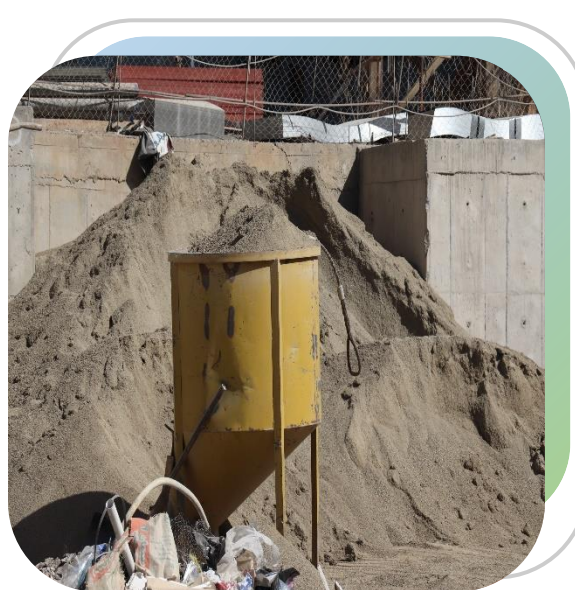

تخلیه بار



- ورود و تخلیه سیمان و پوکه و ماسه در محل پروژه
- ورود و تخلیه گچ برگ و سازه کناف

شرح اجرا

۱۴۰۴.۰۶.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)



۱۴۰۴.۰۷.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)



۱۴۰۴.۰۶.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۴.۰۷.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



