

# بلوک D2

گزارش عملکرد ماهانه

مهر ماه ۱۴۰۴

عمران  
آبشار  
اسیادانا



مجتمع مسکونی  
بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر  
[www.omranabshar.com](http://www.omranabshar.com)





۱۴۰۴.۰۷.۳۰

## اجرای سقف




۱۴۰۴.۰۶.۳۱



- اجرای زیر سازی و قالب بندی و آرماتور بندی  
سقف +۲۹ بال شرقی

شرح اجرا

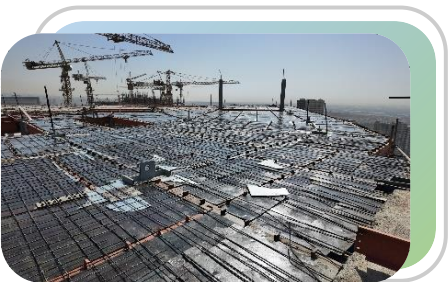

- آغاز اجرای زیر سازی سقف +۲۹ بال شرقی

شرح اجرا







۱۴۰۴.۰۷.۳۰


## واحد‌های مسکونی




۱۴۰۴.۰۶.۳۱




### شرح اجرا

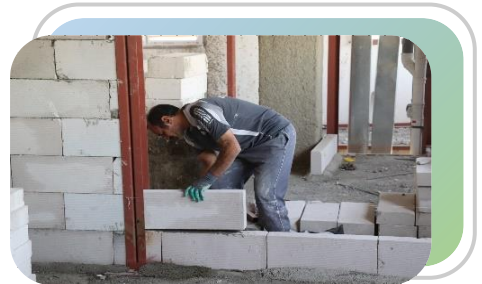




- ادامه اجرای زیر سازی و نصب ورق های آلومینیوم 3D و اجرای نما در بال شرقی و بال غربی
- اجرای نصب سازه و نصب فلاشینگ دور پنجره های بال غربی و بال شرقی
- اجرای نصب وال پست دیوار های پیرامونی طبقه ۲۷+ بال شرقی
- اجرای نصب وال پست و تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقه ۲۶+ بال شرقی
- آغاز نصب رانر های کف و سقف طبقه ۲۳+ بال شرقی
- اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه ۲۲+ و ۲۱+ بال شرقی
- اجرای کروم بندی جهت اجرای گچ کاری طبقه ۱۸+ بال شرقی و بال غربی
- **اتمام** نصب وال پست دیوارهای داخلی طبقه ۲۱+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای گچ کاری (زیر کار) طبقه ۱۶+ بال غربی
- اتمام شیب بندی، پلاستر و عایق بندی سرویس ها ، آشپزخانه ها و تراس های طبقه ۱۵+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای شیب بندی و پلاستر سرویس ها ، آشپزخانه ها و تراس های طبقه ۱۶+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای کاشی کاری سرویس ها و آشپزخانه های طبقه ۱۴+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای کف سازی واحدهای مسکونی طبقه ۱۳+ بال غربی
- **اتمام** اجرای کف سازی واحدهای مسکونی طبقه ۱۴+ بال غربی
- اجرای زیر سازی سقف کاذب طبقه ۶+ بال شرقی

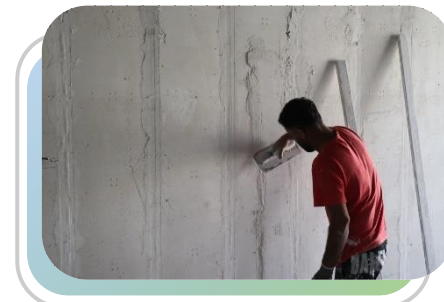

### شرح اجرا

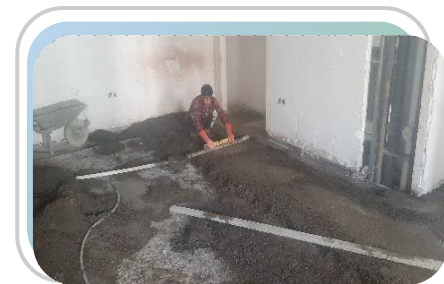



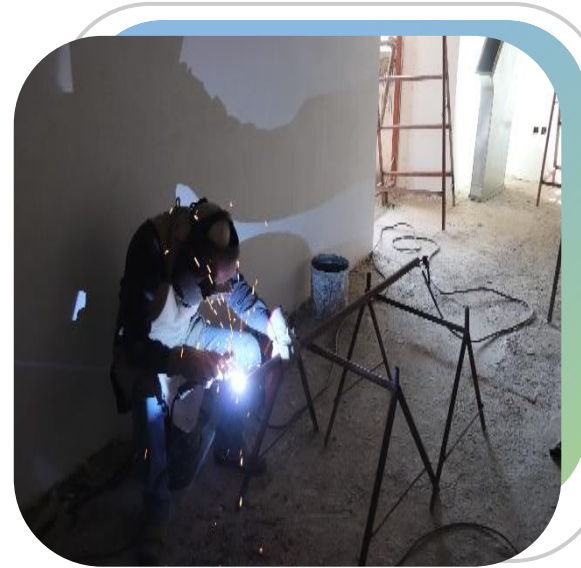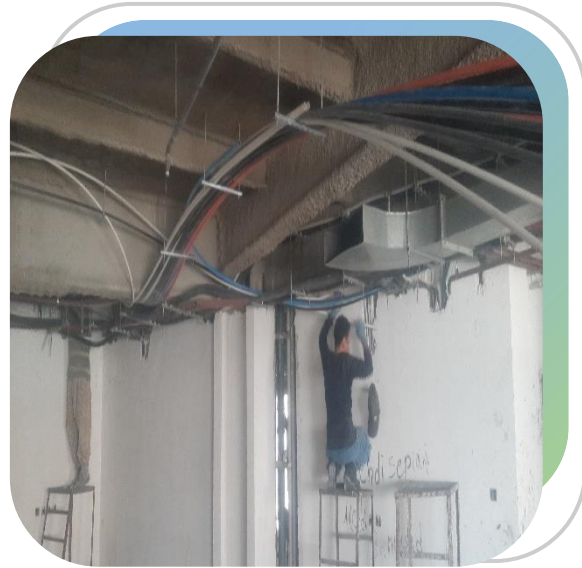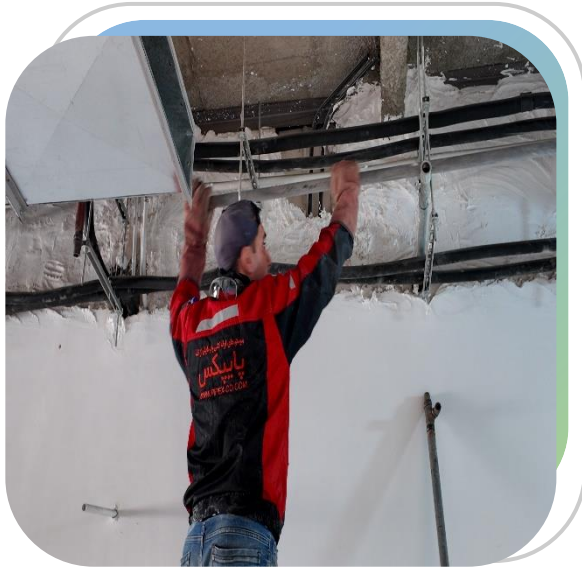

# تاسیسات



- اجرای لوله کشی آشنشانی طبقه ۷+ و ۸+ بال شرقی
- **اتمام** و تحویل لوله کشی آتش نشانی طبقه ۴+ بال شرقی
- اجرای لوله کشی گالوانیزه درین داکت اسپیلت ها طبقه ۱۶+ بال شرقی و بال غربی
- **اتمام** لوله کشی فاضلاب طبقه ۱۸+ بال شرقی
- اجرای نصب ساپورت و لوله کشی ۵ لایه طبقه ۱۸+ بال غربی
- ادامه اجرای لوله کشی برق (لوله سقفی) طبقه ۶+ بال غربی
- اجرای نصب رایزرهای کانال های تهویه در طبقات ۲۸+ بال غربی
- اجرای نصب لوله رایزرهای درین در طبقات ۲۶+ الی ۲۸+
- ادامه ساخت کانال های تهویه

## شرح اجرا





## ضد حریق

○ اجرای پاشش ضد حریق هلی پد

شرح اجرا



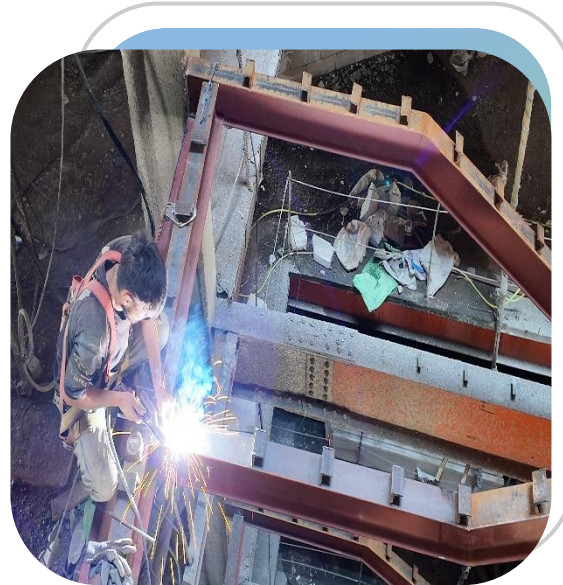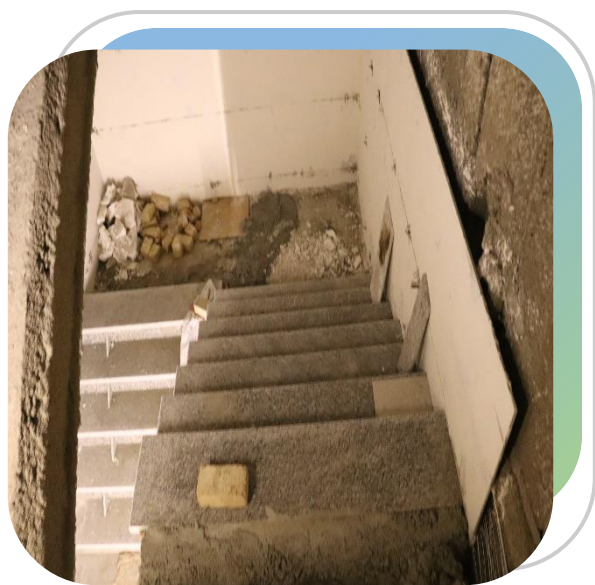


## راه پله ها



- اجرای نصب و فول جوش شمشیری راه پله میانی بال شرقی (طبقه ۱۷+ الی ۲۲+)
- اجرای سنگ راه پله شمالی بال شرقی از طبقه ۲+ الی ۷+
- اجرای برش و ساب سنگ پله
- ادامه اجرای ساخت شمشیری های راه پله ها

✎ شرح اجرا



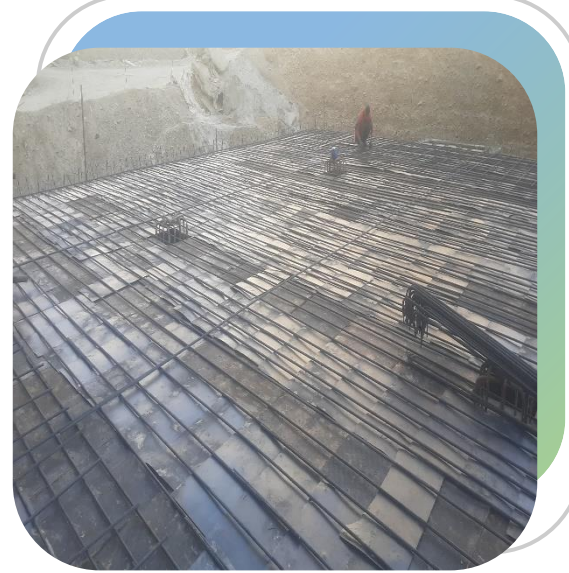

## پارکینگ الحاقی

شرح اجرا ○ اجرای زیر سازی ، قالب بندی و آرماتور بندی سقف طبقه ۱- پارکینگ الحاقی (پارت اول)



## پارکینگ ها

شرح اجرا ○ اجرای پاشش رنگ سقف پارکینگ طبقه ۲- و ۵-





## پست برق



شرح اجرا ○ اجرای زیر سازی ،آرماتور بندی و بتن ریزی سقف پست برق





# تخلیه بار



- ورود و تخلیه گچ، پوکه میلگرد در محل پروژه
  - ورود و تخلیه ایزی وال و هبلکس در محل پروژه
- شرح اجرا** 



۱۴۰۴.۰۶.۳۱

## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)





۱۴۰۴.۰۷.۳۰

## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)





۱۴۰۴.۰۶.۳۱

## تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)





۱۴۰۴.۰۷.۳۰

## تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)





