

بلوک D3

گزارش عملکرد ماهانه
مهر ماه ۱۴۰۴

امران
آبشار
اسیادانا



مجتمع مسکونی
بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر
www.omranabshar.com



۱۴۰۴.۰۷.۳۰


اجرای سقف



۱۴۰۴.۰۶.۳۱




شرح اجرا

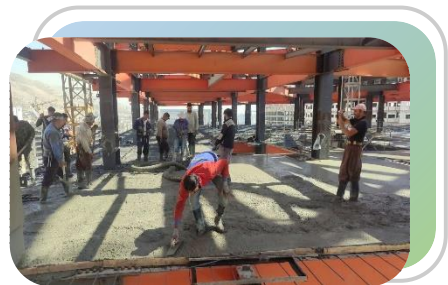

- **اتمام** زیر سازی، قالب بندی، آرماتور بندی و بتن ریزی سقف **+۲۴** بال غربی و بال شرقی



شرح اجرا

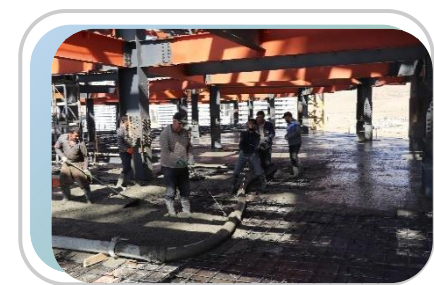

- **اتمام** قالب بندی، آرماتور بندی و بتن ریزی سقف **+۲۳** بال غربی
- اجرای زیر سازی سقف **+۲۴** بال شرقی



نصب تیر و ستون

○ اجرای نصب تیرهای فرعی (ipe) پارت نهم بال غربی

○ اجرای تکمیل کاری و فول پیچ بال شرقی و بال غربی

✎ شرح اجرا



۱۴۰۴.۰۷.۳۰


واحدهای مسکونی



۱۴۰۴.۰۶.۳۱




شرح اجرا


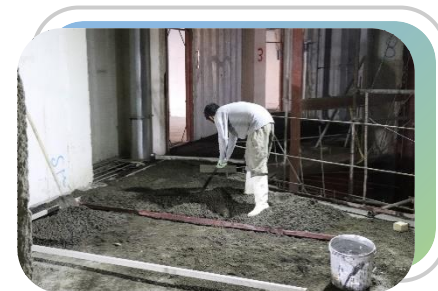


- اجرا و **اتمام** نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقات ۱۹+، ۲۰+ و ۲۱+ بال غربی و بال شرقی
- اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه ۱۴+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه ۱۱+ بال غربی و شرقی
- **اتمام** نصب وال پست دیوارهای داخلی طبقه ۱۲+ بال غربی
- اجرای تکمیل کاری تیغه چینی دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه ۱۰+ بال شرقی و بال غربی
- **اتمام** گچ کاری (زیر کار) طبقه ۸+ بال غربی
- اجرا و **اتمام** کفسازی واحدهای مسکونی طبقه ۸+ بال غربی و بال شرقی
- اجرای نصب عایق بین دیوارها (پشم سنگ) و پنل لایه دوم دیوارهای داخلی طبقه ۵+ بال غربی
- اجرای تکمیل کاری سرامیک کف واحدهای مسکونی طبقه ۲+ بال غربی
- اجرای کاشی کاری سرویس ها و آشپزخانه های طبقه ۲+ بال غربی



شرح اجرا


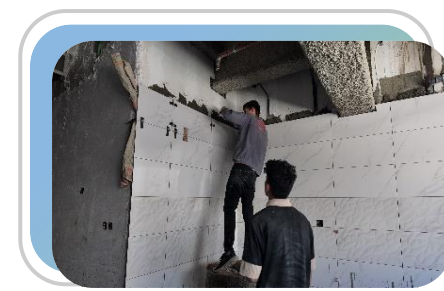


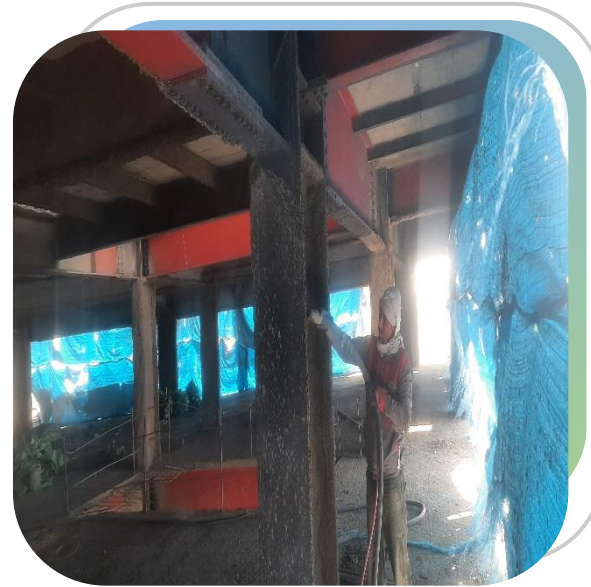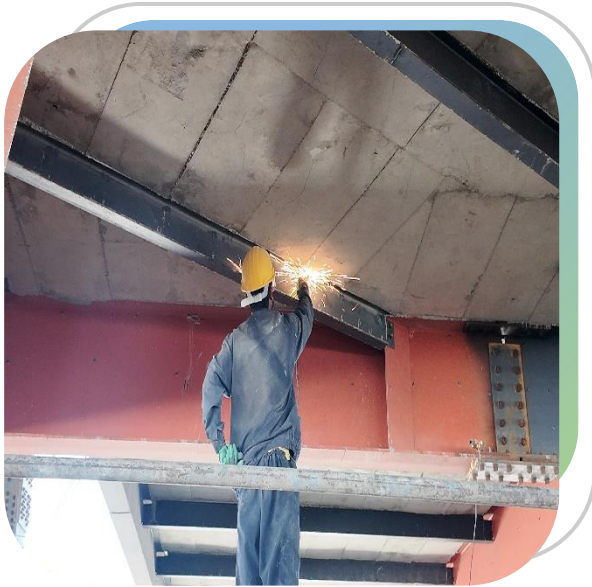

ضد حریق

- اجرای پاشش ضد حریق طبقه ۱۹+ بال شرقی
- اجرای زیر سازی جهت پاشش ضد حریق طبقه ۱۹+ بال غربی

شرح اجرا

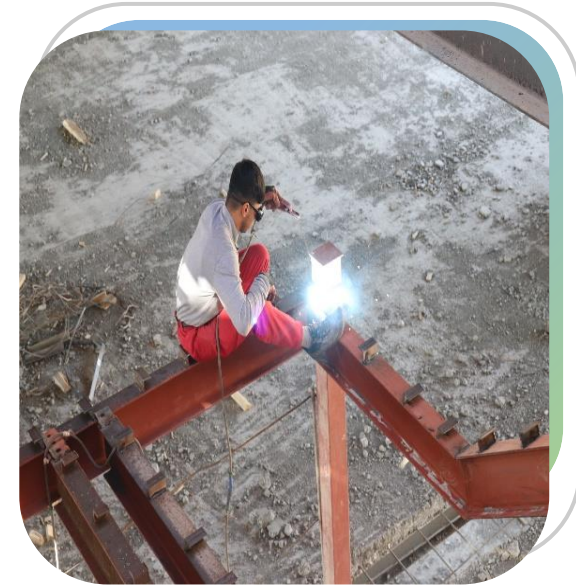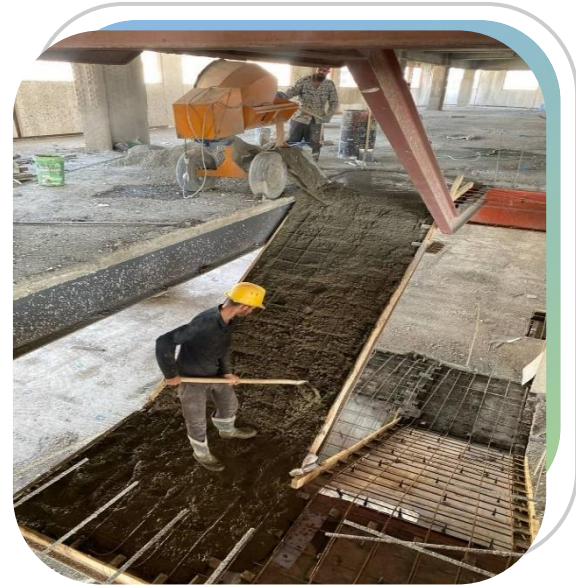


راه پله



- اجرای ساخت و ضد زنگ شمشیری های راه پله
- اجرای نصب شمشیری راه پله میانی بال شرقی تا طبقه ۲۲+
- اجرای نصب شمشیری های راه پله جنوبی بال شرقی تا طبقه ۲۴+
- اجرای نصب شمشیری و بتن ریزی راه پله جنوبی بال غربی طبقه (همکف تا ۱+)
- اجرای زیر سازی ، آرماتور بندی و بتن ریزی راه پله میانی بال شرقی (طبقه ۱۲+ الی ۱۵+)
- اجرای زیر سازی ، آرماتور بندی و بتن ریزی راه پله شمالی بال شرقی (طبقه ۱۳+ الی ۱۶+)


شرح اجرا

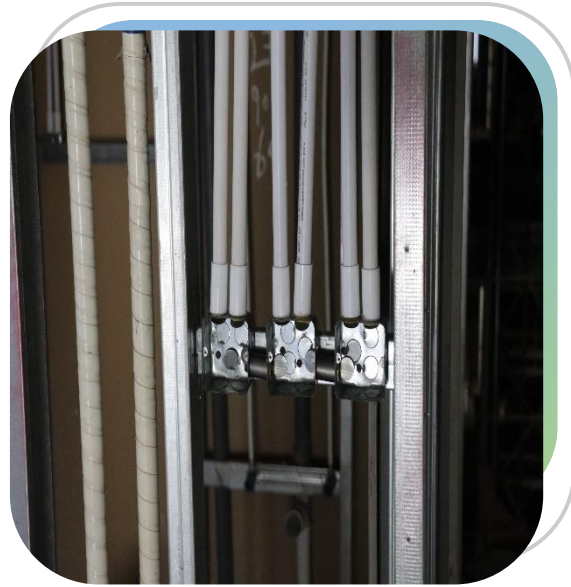

تاسیسات


- اجرا و **اتمام** نصب قوطی های کلید و پریز و لوله های دیوار ی برق طبقه ۶+ بال غربی
- اجرای نصب قوطی های کلید و پریز و لوله های دیوار ی برق طبقه ۶+ بال شرقی

شرح اجرا 

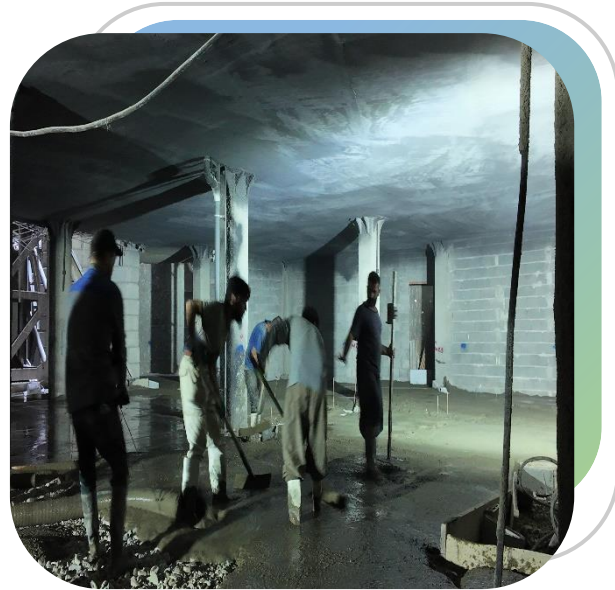

پارکینگ و انباری

- شرح اجرا
- اجرای کامل بتن ریزی مگر کف پارکینگ طبقه ۶-
 - اجرای پاشش رنگ آستر سقف طبقه ۵- پارکینگ الحاقی
 - اجرای پاشش رنگ سقف پارکینگ طبقه ۱- و ۳-

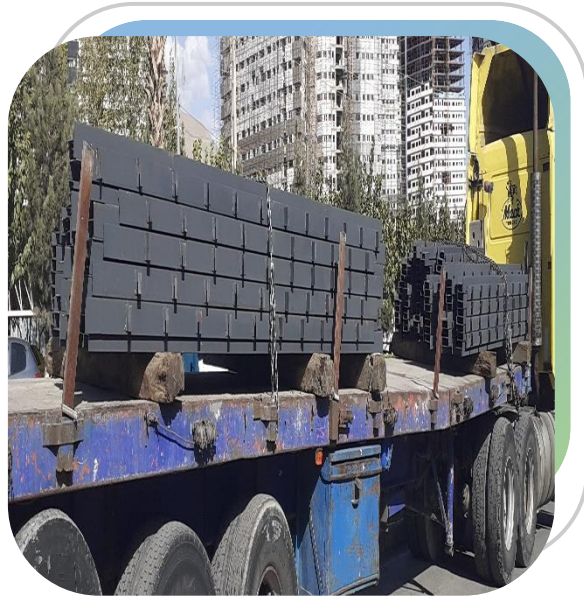

تخلیه بار



- ورود و تخلیه تیرهای فرعی (ipe) پارت نهم
 - ورود و تخلیه بلوک هبلکس جهت اجرای تیغه چینی
 - ورود و تخلیه پوکه و ماسه در محل پروژه
- شرح اجرا** 

۱۴۰۴.۰۶.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)



۱۴۰۴.۰۷.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)



۱۴۰۴.۰۶.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۴.۰۷.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



